

工程竣工验收报告

填报单位(公章): 河南国网输变电工程有限公司

2021年10月4日

工程名称	叶公大道十里铺至沙河大桥电力线路入地工程
建设单位	叶县公路事业发展服务中心
监理单位	平顶山市工程建设监理公司
设计单位	河南天辰高科电力工程设计有限公司
施工单位	河南国网输变电工程有限公司

工程/概算或承包价值 2396000.00 元

开工日期	2021年8月5日	计划竣工日期	2021年10月4日	实际竣工日期	2021年10月4日
工程质量评价	资料	齐全	文明施工	良好	
	安全	良好	施工质量	合格	

主要施工内容为: 电杆拆除及组立; 导线与下户线拆除及架设; 高压计量开关拆除改为落地安装; 变压器台架移位; 箱变安装, 箱变基础制作; 高压环网柜安装, 环网柜基础制作; 电缆顶管; 电缆沟开挖回填; 电缆保护管敷设; 高压及低压电缆敷设, 电缆头制作安装; 隔离开关、避雷器安装; 低压分接箱及动力表箱安装; 电缆耐压试验, 设备系统调试等投标工程量清单内所有工程量。

施工单位:

合格



盖章: 宁珂珂
2021年10月4日

设计单位:


合格



盖章: 郑勇
2021年10月4日

监理单位:


合格

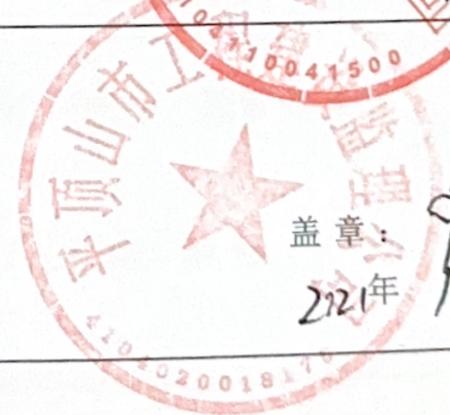

盖章: 范红飞
2021年10月4日

建设单位:

合格



盖章: 王江
2021年10月4日
